




REGIONS FRANCE





LILLE / LOMME
Préfiguration d'un port de plaisance métropolitain



Réunion d'information riverains – 18 Août 2021

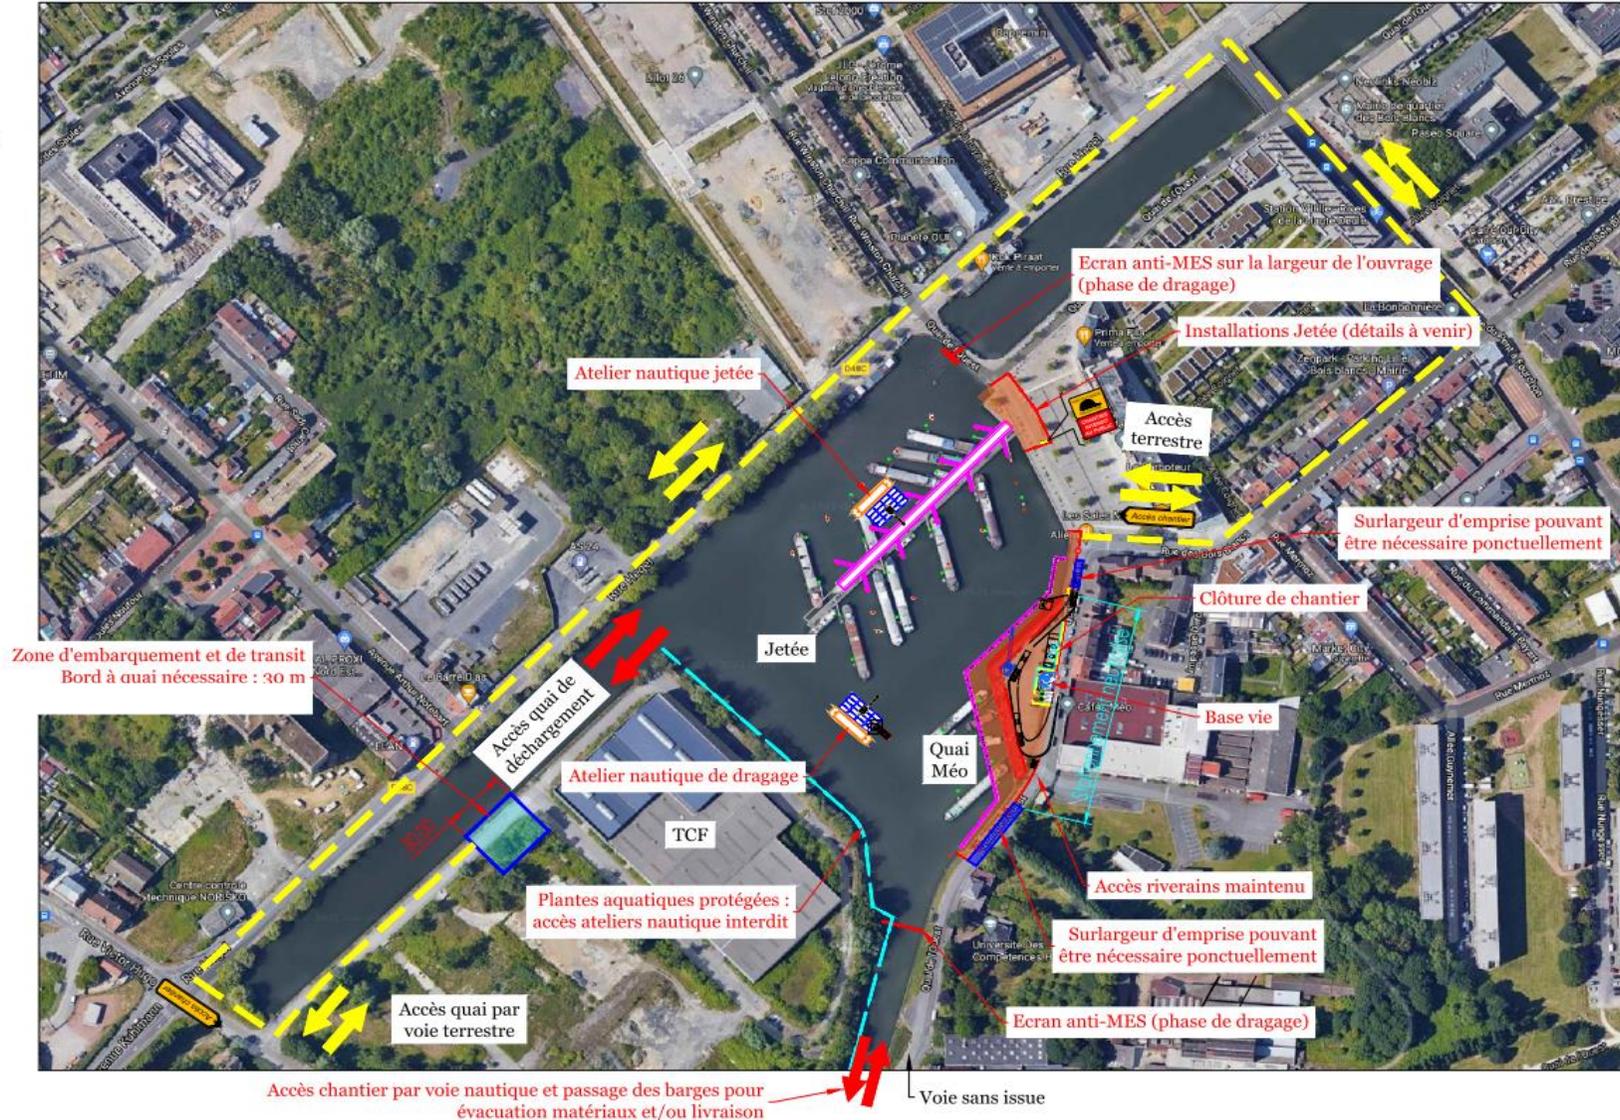

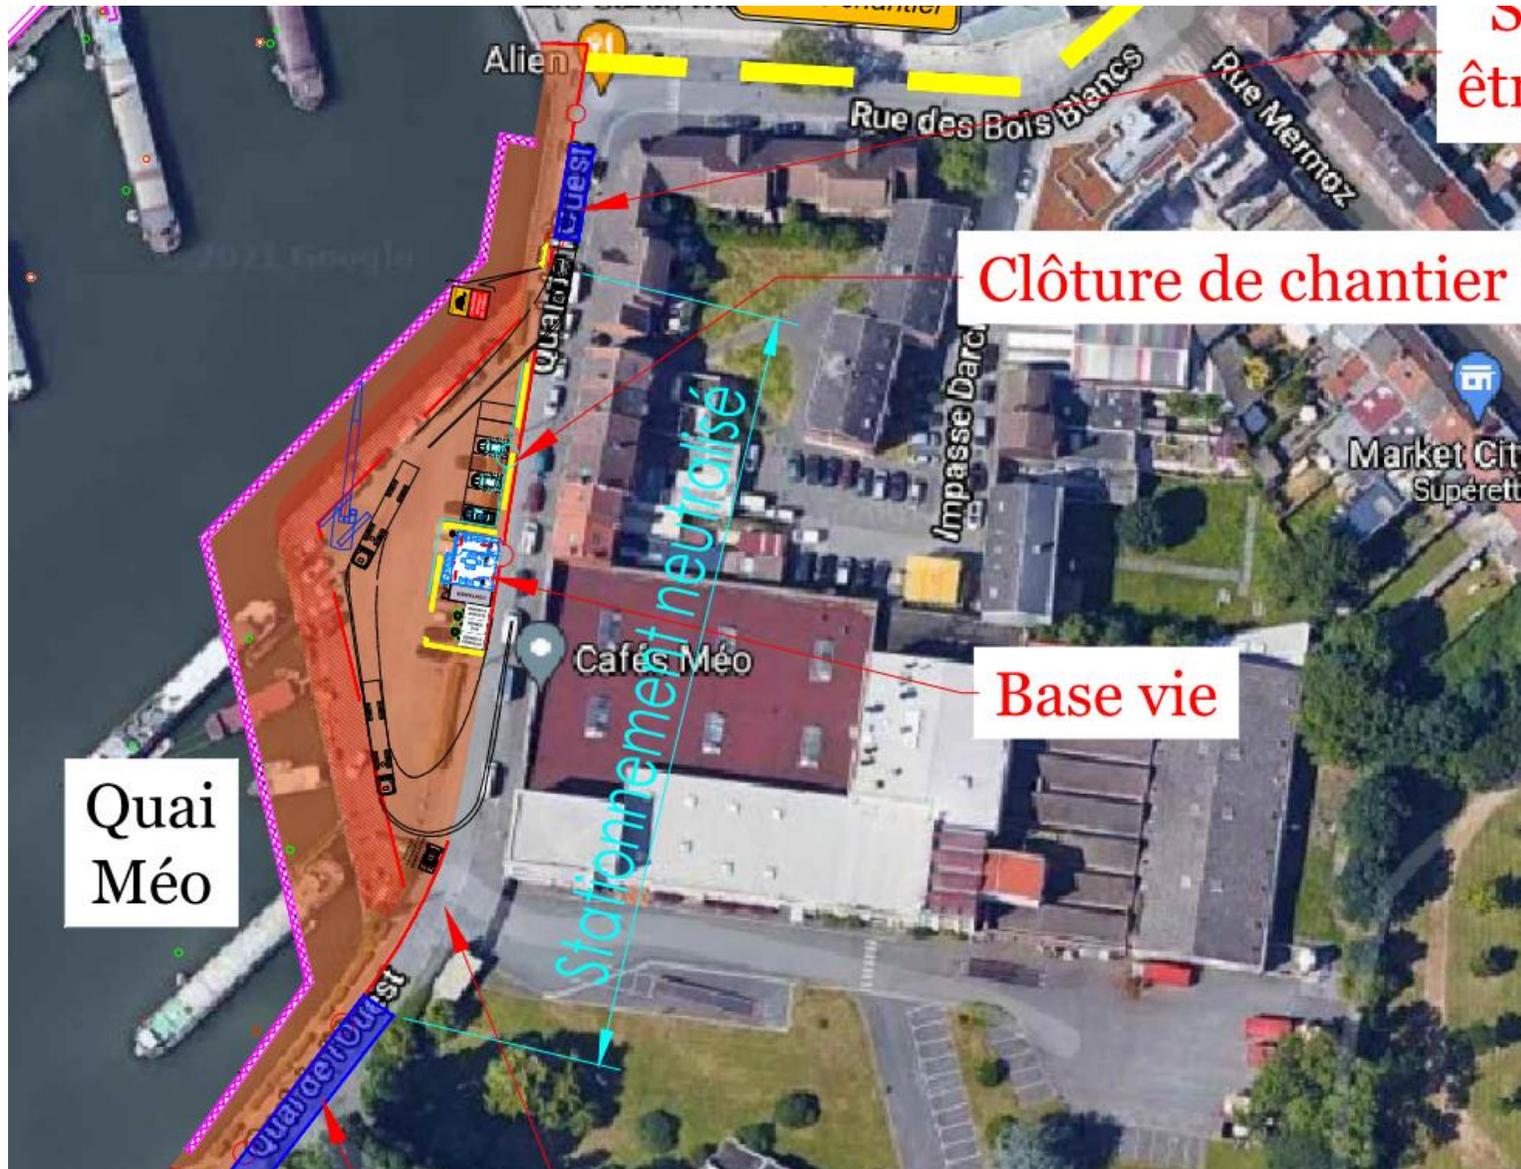

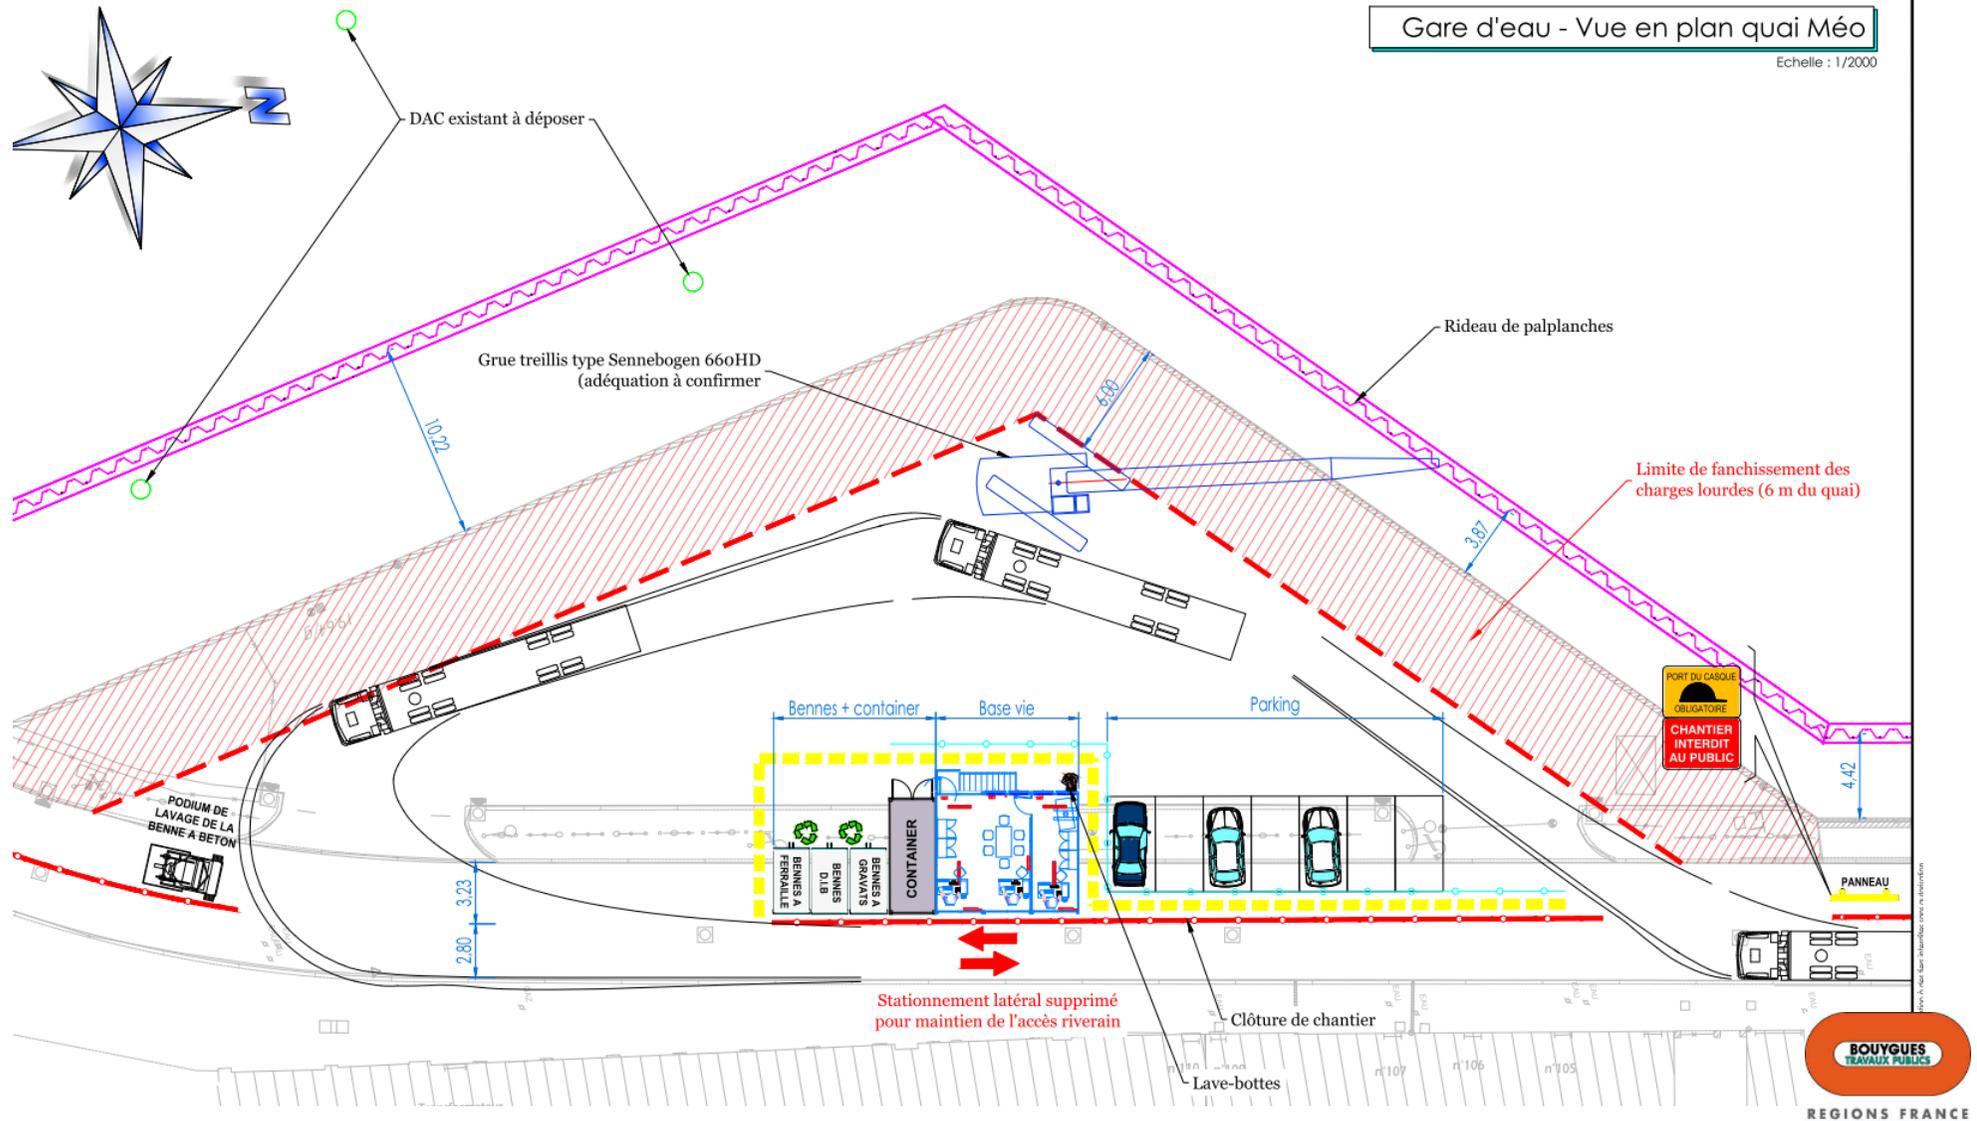

Impacts des travaux :

- Nuisances sonores et vibrations lors des travaux de fonçage des palplanches et des tubes
- Stationnement réduit durant les travaux «Quai de l'Ouest »

Mesures prises :

- Horaires de travail en semaine et en journée (7h-18h)
- Surveillance « bruit et vibration » durant les travaux de fonçage
- Accès des riverains maintenus
- Contrôle de la qualité de l'eau (MES et barrage filtrant)
- Tri des déchets de chantier
- Recyclage matériaux (ferraille et concassé béton)

PLANNING CHANTIER *Dates prévisionnelles hors aléas (météo, covid, approvisionnements...)*

Installation chantier : S34 Août

- installation de chantier, mise en place clôtures, etc

OS démarrage travaux : 6 septembre 2021

PHASE 1 / DEMOLITION DRAGAGE BATTAGE (contraint par l'arrêté préfectoral / DLE)

Septembre à mi octobre 2021 : Arrivée matériel fluvial/Démolition/Evacuation jetée existante
+ Déblais et dépose contre rideau place Méo

Octobre 2021 : Nivellement Sédiments en fond de bassin

Fin Octobre 2021 : Mise en place nouveaux ducs d'albe Jetée

Novembre / décembre 2021 : Battage palplanches place Méo

Novembre / Janvier 2022 : Battage pieux et ducs d'albe Jetée

Décembre 2021 / Janvier 2022 : Mise en œuvre des remblais Place Méo

PHASE 2 / CONSTRUCTION EQUIPEMENTS AMENAGEMENT

Janvier / mars 2022 : Poutre de couronnement Place Méo + génie civil Jetée

Avril a juin 2022 : Viabilisation tous réseaux sur la place Méo et Jetée et mise en œuvre des catways (halte nautique place Méo ; passerelles et bollards Jetée)

Juillet / Septembre 2022 : Réfection des surfaces (bordurage, pavage, enrobés)

Octobre 2022 : Mise en place du mobilier urbain et de la signalétique place Méo.

7

LE SECTEUR DE LA JETÉE

Image projetée « phase PRO » de la jetée et de la place Méo

